

DÉCEMBRE SUR LE CHANTIER




**RÉCUPÉRATION
EX-SITU**




cales
en béton pour
soutenir le ferrillage
de la dalle,
 finition béton apparent



Après avoir fait l'inventaire de toutes les déposes soignées, les ressources ont été repositionnées dans les différents espaces du projet. Les équipements et matériaux manquants ont fait l'objet d'une recherche ex situ : une liste avec les dimensions, quantités, caractéristiques... a été diffusée à tous nos contacts : entreprises du marché, matériauuthèques de la région, réseau régional du réemploi.

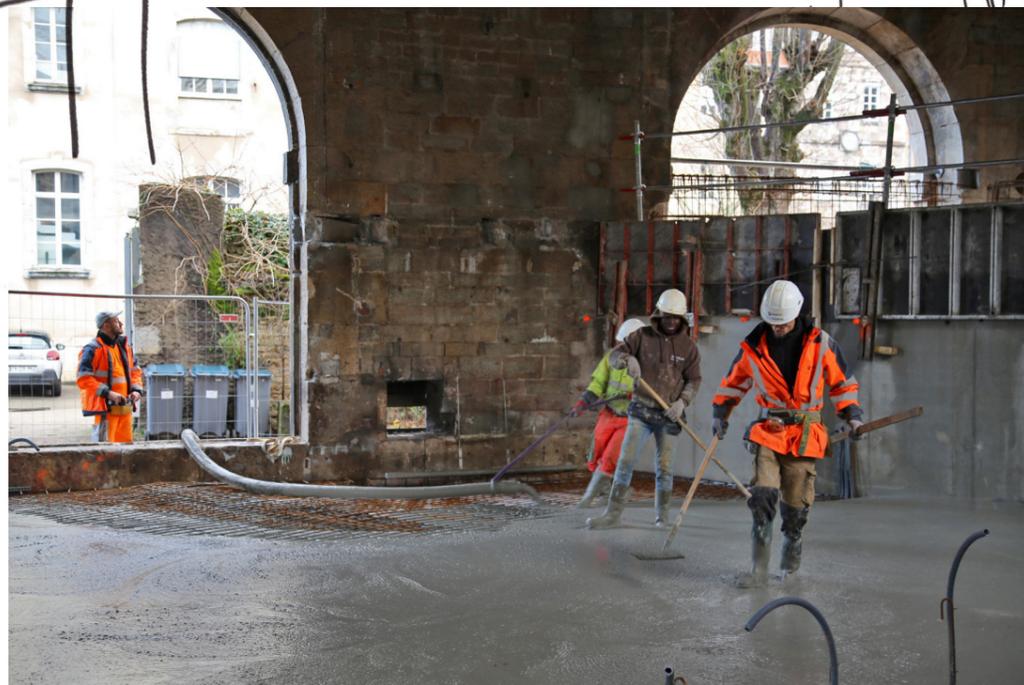

Une fois qu'un gisement est repéré, tous les acteurs (maître d'ouvrage, architecte, bureau de contrôle, bureaux d'étude, entreprises de pose) sont mis dans la boucle pour valider les caractéristiques de l'élément (dimensionnelles, esthétiques ou techniques...). Le lot réemploi assure ensuite la dépose si nécessaire, la livraison jusqu'au chantier, puis la remise en état et le stockage.

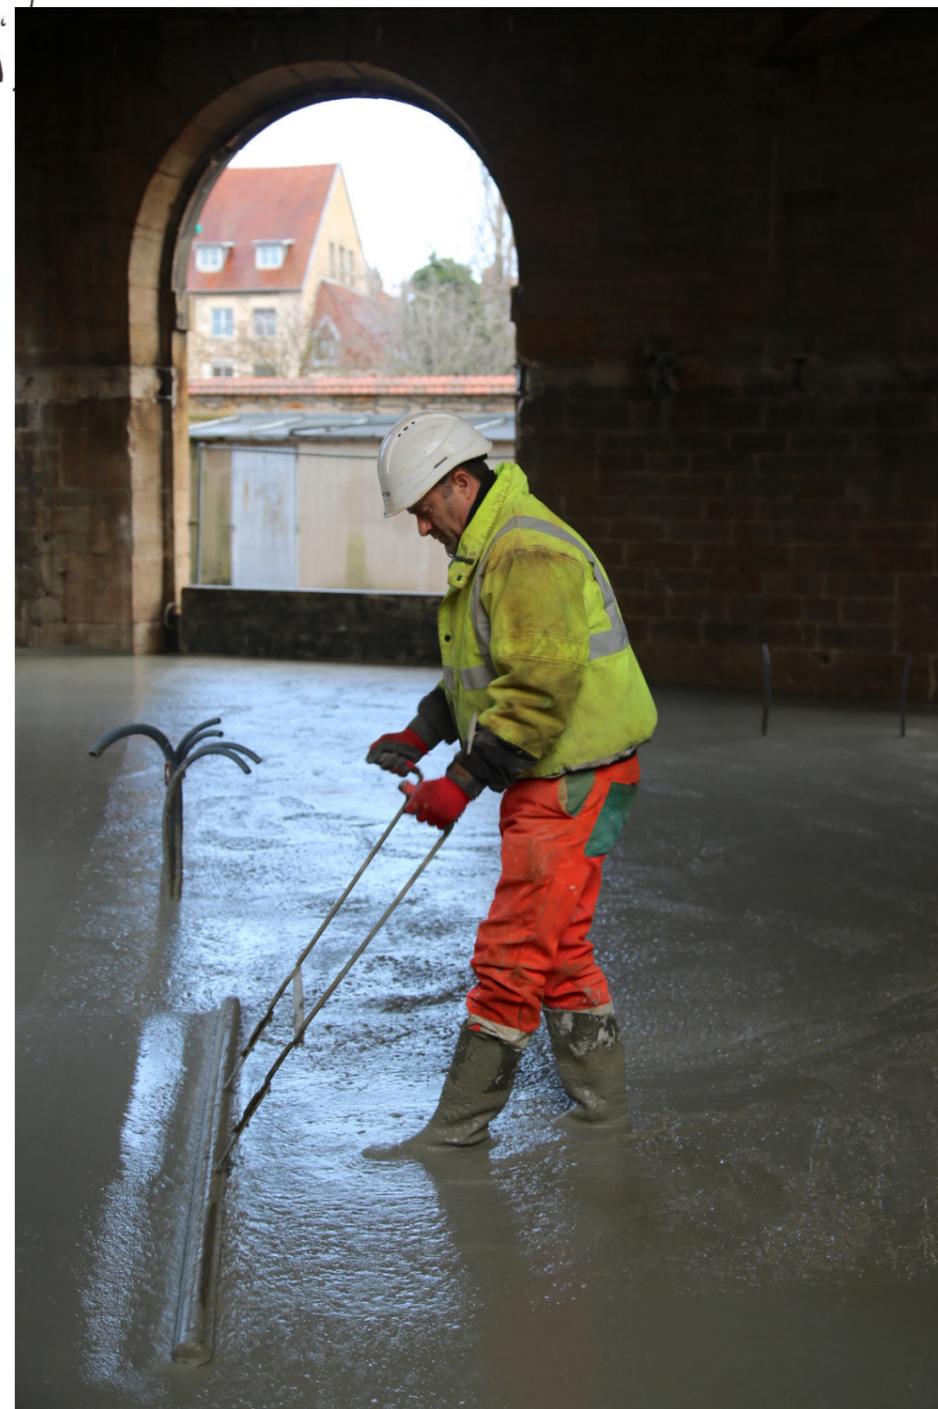

Le rayon géographique des éléments récupérés s'établit actuellement à 250 km, avec Strasbourg au plus loin et l'hôpital Saint Jacques au plus proche, en passant par la République du Saugeais. Il s'agit aussi bien d'équipements de finition (cuvettes suspendues, urinoirs, vidoirs, portes) que d'équipements techniques (chemins de câble, luminaires) ou de matière première (laine minérale). Seize lots sur les vingt-six du chantier sont concernés par le réemploi et seront mis à contribution pour réintégrer ces éléments dans le projet.

En parallèle, le chantier continue, avec notamment la mise en place des poteaux mixtes (profilés acier remplis de béton) et de la charpente métallique dans les grandes salles du RDC et des amphithéâtres, par l'entreprise Obliger. Les murs en béton sont petit à petit décoffrés par SMBTP, et la pose des premiers escaliers donne de la hauteur à ce projet d'ampleur.

