


OCTOBRE SUR LE CHANTIER



RÉGION ACADÉMIQUE
BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ

*Liberté
Égalité
Fraternité*

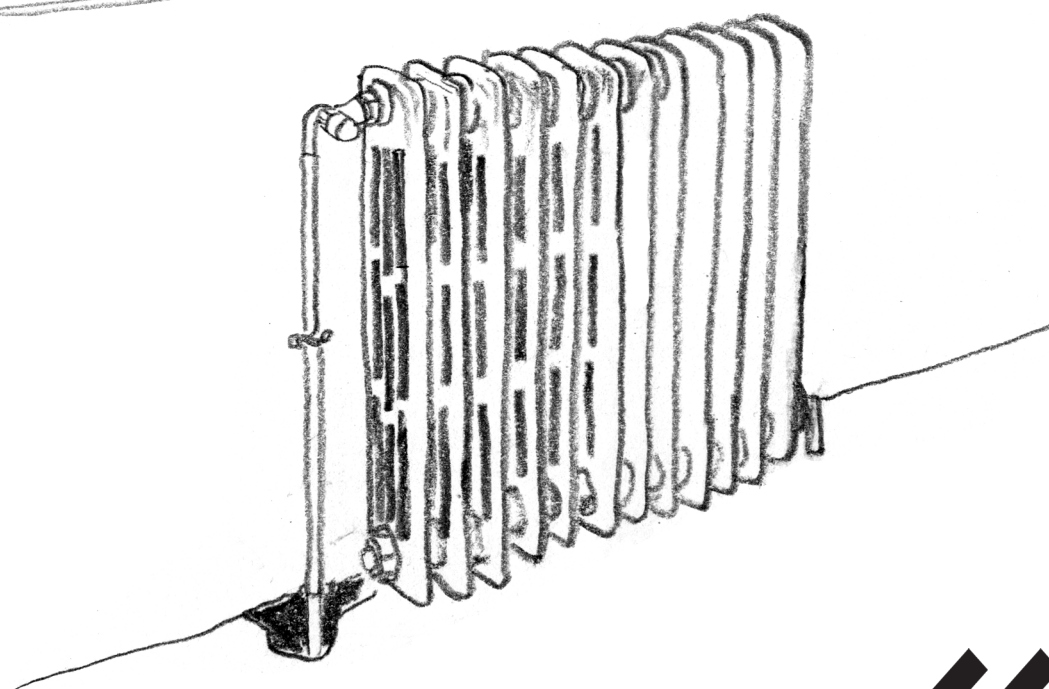

CHAUFFAGE



L'hiver se profilant, les travaux prioritaires sont ceux permettant de mettre en route le chauffage du bâtiment. Le complexe de plancher chauffant a été réalisé dans le hall du bâtiment, avec la pose de l'isolant sur dallage, la mise en place des tuyaux échangeurs de chaleur, et enfin le coulage de la chape venant englober ces derniers. Il ne restera plus qu'à poser le revêtement de sol de finition, qui incorporera des morceaux de tuiles, chutes récupérées des travaux de couverture.



Au R+2, les radiateurs fonte de réemploi ont été livrés par l'association TRI, qui les a acheminés depuis l'atelier sur un chariot aménagé spécifiquement, avant de les faire monter par l'ascenseur. L'entreprise EIMI, qui les a réceptionnés à l'étage, les distribue dans les différentes pièces avant de commencer leur raccordement.





Au R+3, les radiateurs acier neuf sont positionnés contre les arbalétriers bois (grandes pièces de charpente). Le chantier pourra ainsi être chauffé partiellement, afin de conserver une température et humidité constantes pour la bonne conservation des ouvrages déjà réalisés, notamment les menuiseries bois qui, si elles sont soumises à de trop grandes variations, risquent de se déformer.



En intérieur, les électriciens commencent à poser leurs chemins de câble, qui resteront apparents dans les circulations, tout comme les gaines de ventilation et les distributions de chauffage. Cette volonté de sobriété de l'architecte permet de diminuer la masse de matériaux utilisés, en s'affranchissant d'un faux-plafond.

C'est aussi ça l'économie circulaire : éviter tout matériau ne répondant qu'au seul critère esthétique.

