

DÉCEMBRE SUR LE CHANTIER




PROTOTYPES





La préparation des matériaux de réemploi par CDEI et TRI avance : relamping des luminaires, nettoyage des cuvettes de toilettes, remise en état des radiateurs fonte... Un prototype pour ces derniers a été monté par les chauffagistes d'EIMI, devant le prototype d'enduit chaux et avec tous les accessoires (vanne thermostatique, bouchons, pieds...), pour que l'architecte valide les teintes.

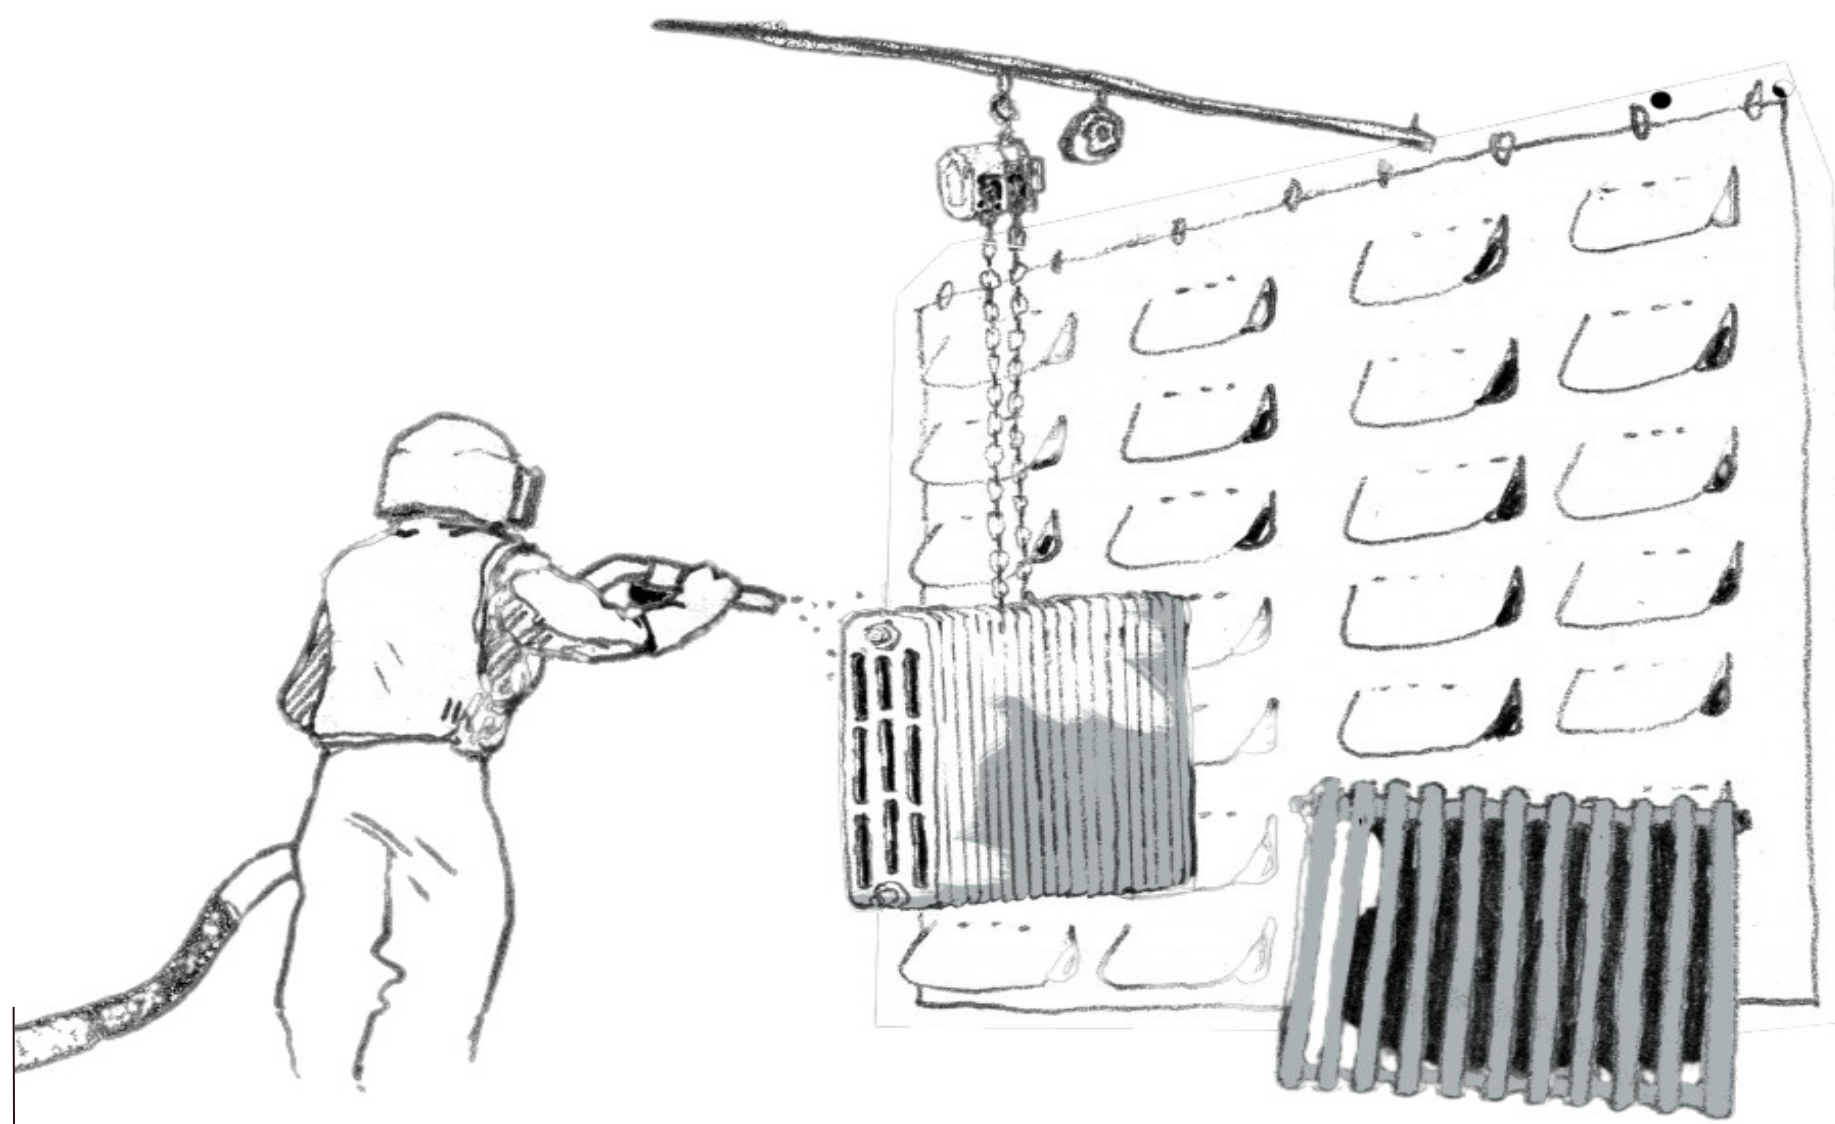



Un autre prototype a également été réalisé pour le sol en tuiles. L'entreprise Maccanin a découpé chaque tuile dans la longueur, avant de les positionner sur la tranche à égales distances et pour former un motif chevron. Un liant est ensuite coulé entre les tuiles, puis un ponçage et un vernissage sont réalisés afin d'obtenir un sol de niveau. Le prototype est très satisfaisant, la réalisation du sol fini au RDC est attendue avec impatience !

Côté couverture, les tuiles sont quasiment toutes en place, et l'entreprise s'attaque à présent au terrasson, la partie presque horizontale du toit, qui sera revêtu de feuilles de zinc et assurera le passage de l'eau entre les tuiles et les descentes d'eau de pluie. Le bâtiment est bientôt hors d'eau !

